



PLANO DE TRABALHO

2ª prorrogação do PA 10.469/2023 - Custeio – Capitão Derrite: Para prestação de serviço em manutenção da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE	4
OBJETO A SER EXECUTADO	13
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	14
PÚBLICO-ALVO	14
ESTRUTURA FÍSICA.....	14
AÇÕES INDISPENSÁVEIS	14
METAS A SEREM ATINGIDAS.....	14
RECURSOS HUMANOS	16
RECURSOS MATERIAIS.....	16
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	16
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	17
OBJETIVOS GERAIS.....	17
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	17
VALOR DA PROPOSTA	17
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	18
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO	20

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br projetos@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente
RG	4. [REDACTED] -9
CPF	434. [REDACTED] -68
DATA DE NASCIMENTO	12/08/1946
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, etnia, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e Região e suas instalações não atendem na íntegra as exigências das normas técnicas e de funcionamento vigentes como a RDC 50 de 2002, a RDC 63 de 2011, a ABNT NBR 135342-008; a NBR 12188-2016, a NBR ISSO 16651-2019. Tal cenário desencadeou desde o ano de 2019 a execução de diversos projetos de reformas, manutenções e adequações de infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização, pintura, revestimentos etc.


No que tange ao revestimento do piso e do forro de toda a área hospitalar encontram-se desgastados, com soluções de continuidade devido ao tempo de uso. As esquadrias existentes no hospital são antigas, não atendem os requisitos preconizados para estabelecimentos de saúde e não são padronizados. Esses itens: piso, forro, esquadrias estão sendo substituídos gradualmente de acordo com as reformas e manutenções dos respectivos prédios.

A parte elétrica e hidráulica dos prédios são antigas e fora dos padrões de segurança vigentes e existem setores do hospital que estão sem bate-macas e cantoneiras.

Segue abaixo a situação atual por Bloco no que se refere aos itens objeto do presente Plano de Trabalho.

1. Bloco São Camilo (antigo Bloco B)

Conta com uma área de 7.070,00 m² e abrigará em seus pavimentos conforme layout abaixo leitos de internação, apoio técnico, administrativo e operacional:

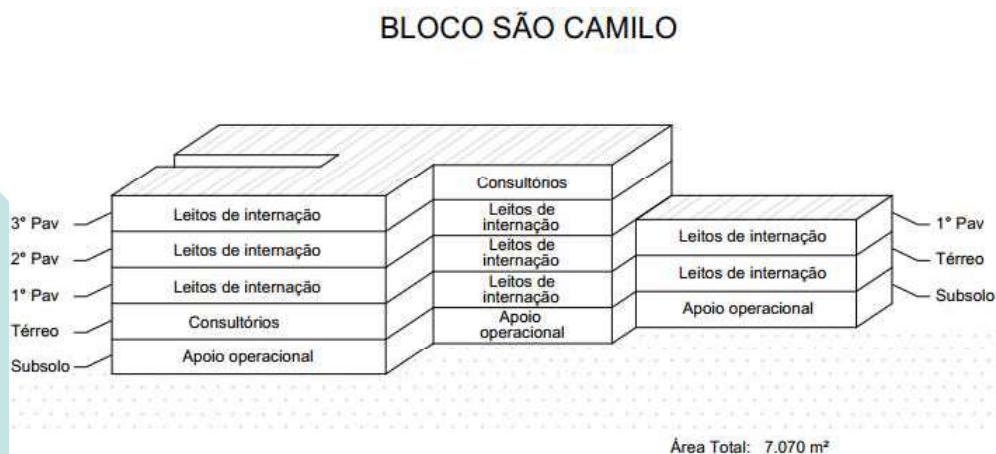

Situação atual:

- As esquadrias das áreas de internação do Bloco São Camilo não dispõe de padronização, e encontram-se fora das exigências para estabelecimentos de saúde:




- O revestimento de pisos das áreas de circulação e dos quartos do Bloco São Camilo: de granilite, partes são com vinílico em placas



2. O Bloco São Miguel (antigo bloco A)

Conta com uma área de 9.701 m², térreo e mais 5 pavimentos, sendo que o térreo abriga área de apoio administrativo, de internação, Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Neonatal e um Centro de Diagnóstico conforme layout abaixo:

BLOCO SÃO MIGUEL

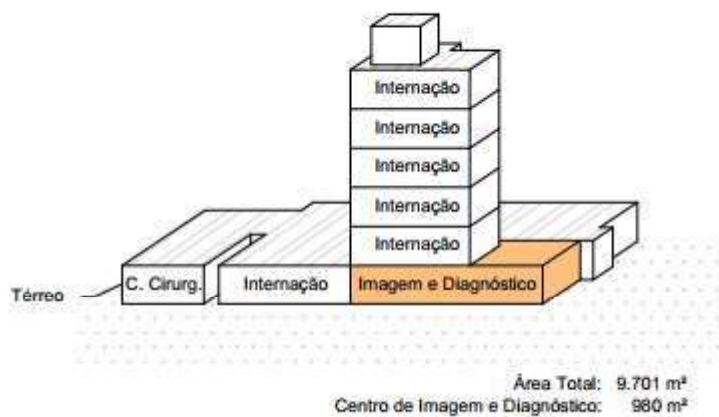

Situação atual:

- A área destinada ao Centro Diagnóstico passou por reparos no ano de 2017 e nesse momento apresenta necessidade de nova pintura, reparos elétricos e substituição de forro, além de instalação de bate macas e cantoneiras.













OBJETO A SER EXECUTADO

Plano original

Custeio - prestação de serviço especializado.

Bloco São Camilo:

- Substituição de esquadrias;
- Substituição de revestimento de piso.

Bloco São Miguel:

- Substituição de forro;
- Pintura de parede interna e portas;
- Substituição de luminárias;
- Substituição de piso;
- Substituição de bate macas e cantoneiras.

1ª prorrogação

O objeto do Plano Original se mantém, tendo sido adquirido até o momento prestação de serviços parcial de forro de gesso. O pedido de prorrogação se dá devido a impossibilidade de continuar a execução dos trabalhos neste momento, pois a entrada principal de transeuntes no hospital é neste local das futuras intervenções.

As adequações propostas em Plano de Trabalho, serão realizadas após a inauguração da nova entrada do hospital (prevista para abril/2025) para que todo o fluxo seja direcionado para lá e com isso possibilitar o isolamento das áreas e realizar as reformas propostas. Em tempo informamos que a execução do objeto para reforma do Bloco São Camilo está em processo de aquisição.

2ª prorrogação

O objeto do Plano Original se mantém.

No bloco São Camilo as instalações de piso vinílico estão sendo executadas em áreas isoladas (inoperantes), enquanto as esquadrias estão em fase de orçamentos, aquisição e contratação.

No bloco São Miguel, tendo sido adquirido e executado parcialmente até o momento, prestação de serviços de forro de gesso, piso, pintura, portas, luminárias, bate macas e cantoneiras no setor de imagens do hospital.

O pedido de prorrogação se dá devido a impossibilidade de continuar a execução dos trabalhos neste momento, pois, devido a diversas frentes de trabalho no Hospital, um dos locais objeto da reforma está atendendo provisoriamente o setor de ortopedia, impedindo o prosseguimento das obras no local na área de imagem no Bloco São Miguel. Para uma melhor assistência dos pacientes, a Ortopedia será alocada definitivamente para o pavimento térreo do Bloco São Camilo, assim que a reforma no espaço for finalizada.

O mesmo ocorre no Bloco São Camilo, onde há locais da reforma com atendimento operante, cerceando as instalações dos pisos vinílicos.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a execução será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Desmobilização das áreas assistenciais e administrativas a serem adequadas, sendo que a instituição remaneja para outras áreas sem prejuízo ao atendimento prestado;
2. Mediante programação de adequações e de manutenção, a gerência predial e setor de engenharia solicita orçamentos junto a empresas especializadas no mercado (mapas de cotação anexos);
3. Analisa as propostas/orçamentos recebidos.
4. Após avaliação do engenheiro da Instituição responsável pela manutenção predial, a equipe técnica selecionará o menor preço, melhor técnica e melhor custo-benefício, seleciona a empresa e inicia a execução.
5. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Projetos Arquitetônico nos moldes previstos nas Legislações pertinentes, quando for o caso.
6. A prestação de serviços seguirá de acordo com a Lei 6.496/77 (ART).

PÚBLICO-ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão:

- Os usuários SUS e funcionários da Instituição que usufruirão de áreas do Bloco São Camilo e Bloco São Miguel de acordo com as normas técnicas e de funcionamento vigentes, espaços acolhedores e humanizados;

ESTRUTURA FÍSICA

Instalações físicas objeto:

- ✓ **Leitos de internação do Bloco São Camilo – layout no item Descrição da Realidade;**
- ✓ **Área do Centro Diagnóstico do pavimento térreo do Bloco São Miguel – layout no item Descrição da Realidade.**

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica;
2. Realizar Cotação Prévia De Preços;
3. Contratar empresa especializada para execução dos serviços;
4. Monitorar o cumprimento do contrato;
5. Prestar Contas.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativas: Garantir a pintura de 666,06 m² de parede, a substituição de 558,52 m² de forro, 417 m² de piso e 63 luminárias no Bloco São Miguel;

Ações para Alcance: realização de pintura de 666,06 m² de parede, instalação de 558,52 m² de forro, 417 m² de piso e 63 luminárias no Bloco São Miguel;

Situação Atual: Pintura, forro, piso e instalações elétricas Bloco São Miguel, velhos, desgastados, com solução de continuidade.

Situação Pretendida: Pintura, forro, piso e instalações elétricas novas na área do centro diagnóstico do Bloco São Miguel.

Indicador de Resultado: Total de metros quadrados de pintura, piso, forro e instalações elétricas na área do centro diagnóstico do Bloco São Miguel.

Fórmula de Cálculo do Indicador:

$M^2 \text{ de piso vinílico instalado} / M^2 \text{ de piso vinílico proposto} \times 100$

$M^2 \text{ de forro instalado} / M^2 \text{ de forro instalado proposto} \times 100$

$M^2 \text{ de parede com pintura nova no Bloco São Miguel} / M^2 \text{ de parede com pintura velha no Bloco São Miguel} \times 100$

$N^{\circ} \text{ de luminárias substituídas} / n^{\circ} \text{ de luminárias propostas de substituição} \times 100$

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Quantitativas: Garantir a instalação de 106 esquadrias e 465,2 m² de piso vinílico na área de internação do Bloco São Camilo;

Ações para Alcance: Instalação de 106 esquadrias e 465,2 m² de piso vinílico na área de internação do Bloco São Camilo.

Situação Atual: Esquadrias e piso fora dos padrões definidos na RDC 50

Situação Pretendida: Esquadrias e piso atendendo a RDC 50, apresentando alta durabilidade, resistência e fácil limpeza contra fungos e bactérias.

Indicador de Resultado: Total de esquadrias e área de piso instaladas na internação no Bloco São Camilo

Fórmula de Cálculo do Indicador: $N^{\circ} \text{ de esquadrias instaladas} / n^{\circ} \text{ de esquadrias planejadas no presente Plano de Trabalho} \times 100$

$M^2 \text{ de piso vinílico instalado} / M^2 \text{ de piso vinílico proposto} \times 100$

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Qualitativa: Aumentar o nível de satisfação dos usuários referente às instalações físicas no Bloco São Camilo e São Miguel

Ações para Alcance: Instalação de climatização e novas esquadrias de áreas de internação do Bloco São Camilo, e de nova pintura, forro, piso e elétrica no Bloco São Miguel;

Situação Atual: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom

Situação Pretendida: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre superior a 80% entre ótimo e bom

Indicador de Resultado: Relatório de Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas dos Blocos São Camilo e São Miguel antes das reformas propostas x pesquisa de satisfação referente às instalações físicas após as reformas propostas.

Fórmula de Cálculo do Indicador: $\text{Percentual de satisfação referente às instalações físicas antes da reforma proposta} / \text{percentual de satisfação referente às instalações físicas após a reforma proposta} \times 100$

Fonte do Indicador: Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação direta de Recursos Humanos, tendo em vista que o Plano de Trabalho tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto.

Ficará sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Projeto: Pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando for o caso;
2. Execução da Emenda: pela Secretaria da Saúde que poderá designar outros membros para auxiliá-los no exercício da fiscalização;
3. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Sintético

Fase	Ação	Prazo	Status
Fase 1	Seleção de empresas para fornecimento da prestação de serviços	15 dias	Parcial
Fase 2	Execução dos serviços conforme cronograma de desembolso / Acompanhamento das metas e indicadores	Conforme estipulado no cronograma	Parcial
Fase 3	Realizar fiscalização/ vistoria ao final de cada etapa de execução, elencadas no cronograma de prestação de serviços		A iniciar
Fase 4	Emissão de relatórios de prestação de contas referente a execução do projeto e da parte financeira	Mensal	A iniciar
Fase 5	Emissão de relatórios de prestação de contas. Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas	Trimestral e ao final da execução	A iniciar

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVOS GERAIS

- Atender às Normas Técnicas de funcionamento e de segurança, principalmente a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Qualificar o tratamento do ar;
2. Proporcionar superfícies e revestimentos de piso e paredes que viabilizem a adequada higienização;
3. Humanizar o ambiente assistencial.

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio Bloco São Camilo e Bloco São Miguel – Santa Casa de Sorocaba.
Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP.

VALOR DA PROPOSTA

Plano original:

R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais)

1ª prorrogação (valor restante do recurso):

R\$973.700,63 (Novecentos e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e três centavos) já repassados e **R\$26.299,37** (vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove e trinta e sete centavos) a receber.

2ª prorrogação (valor restante do recurso):

R\$973.700,63 (Novecentos e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e três centavos) já repassados e **R\$26.299,37** (vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove e trinta e sete centavos) a receber.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%	Total	%
1	Custeio	Aquisição de prestação de serviços (material e mão de obra) para instalação de esquadrias.	R\$ 221.041,56	R\$ 0,00	0	R\$ 221.041,56	100	R\$ 221.041,56	100
2	Custeio	Aquisição de prestação de serviços (material e mão de obra) para instalação de piso vinílico.	R\$ 120.952,00	R\$ 0,00	0	R\$ 120.952,00	100	R\$ 120.952,00	100
3	Custeio	Aquisição de prestação de serviços material e mão de obra) manutenção e reforma	R\$ 658.027,78	R\$ 21,34	0,003243	R\$ 658.006,44	99,996757	R\$ 658.027,78	100
Total			R\$ 1.000.021,34	R\$ 21,34	0,002134	R\$ 1.000.000,00	99,997866	R\$ 1.000.021,34	100

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso	Situação
1 (1ª Parcela)	R\$ 491.338,38	100	R\$ 0,00	0	R\$ 491.338,38	100	R\$ 491.338,38	Pago em 16/09/24
2 (2ª Parcela)	R\$ 131.812,44	100	R\$ 0,00	0	R\$ 131.812,44	100	R\$ 131.812,44	Pago em 16/10/2024
3 (3ª Parcela)	R\$ 89.721,16	100	R\$ 0,00	0	R\$ 89.721,16	100	R\$ 89.721,16	Pago em 08/11/2024
4 (4ª Parcela)	R\$ 82.307,58	100	R\$ 0,00	0	R\$ 82.307,58	100	R\$ 82.307,58	Pago em 06/12/2024
5 (5ª Parcela)	R\$ 178.521,07	100	R\$ 0,00	0	R\$ 178.521,07	100	R\$ 178.521,07	Pago em 24/01/2025
6 (6ª Parcela)	R\$ 26.320,71	100	R\$ 21,34	0,08107684	R\$ 26.299,37	99,918923	R\$ 26.320,71	A receber
7	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
Total	R\$ 1.000.021,34	100	0	0	R\$ 1.000.000,00	100	R\$ 1.000.021,34	

Observação: os valores que constam são os orçamentos de menor preço.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba aportará R\$ 21,34 (vinte um Reais e trinta e quatro centavos) como contrapartida desta emenda com recurso próprio.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
OBRA: BLOCO SÃO CAMILO (SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E PISO VINÍLICO / BLOCO SÃO MIGUEL (REFORMA DO SETOR DE IMAGENS))																			
M4 - PA 10.469/2023																			
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Até ago/2025	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	
1	ESQUADRIAS	R\$ 221.041,56	% Período:						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	PISO VINÍLICO	R\$ 120.952,00	% Período:	67,92%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,08%								
				R\$ 82.150,00	6.047,60	6.047,60	6.047,60	6.047,60	6.047,60	6.047,60	2.516,40								
3	POSTO DE OBSERV. BANHEIRO, RUP, SALA COMANDO, SALA EXAME, COMP. TÉCNICOS, VESTIÁRIO CONSULTÓRIO.	R\$ 149.344,82	% Período:	30,79%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,21%							
				R\$ 45.982,00	7.467,24	14.934,48	14.934,48	14.934,48	14.934,48	14.934,48	14.934,48	6.288,69							
4	SALA TÉCNICA VESTIBULO, SALA DIGITAÇÃO, MAMOGRAFIA 1, MAMOGRAFIA 2, COMANDO DE TOMOGRAFIA, BANHEIRO, DEPOSITO, REPARO DE MEDICAMENTO, DENTISTOMETRIA.	R\$ 131.812,44	% Período:						10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
									13.181,24	13.181,24	19.771,87	19.771,87	19.771,87	19.771,87	19.771,87	13.181,24	13.181,24		
5	RAIO X, BANHEIROS, COMANDO	R\$ 89.721,16	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
							8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12	8.972,12		
6	HALL, DIGITALIZAÇÃO, VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS, DEPOSITO, US1, BANHEIROS, US2, ARDM DE INVERNO.	R\$ 82.307,58	% Período:	44,92%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,08%					
				R\$ 36.974,00			4.115,38	4.115,38	8.230,76	8.230,76	8.230,76	4.115,38	4.115,38	4.179,79					
7	CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, BANHEIROS, ADM, LAUDOS, ENTREGA DE EXAMES, BANHEIROS, RAIOX, SALA DIGITALIZAÇÃO E BANHEIRO, US3 E BANHEIRO.	R\$ 178.521,07	% Período:	26,22%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	3,78%				
				R\$ 46.809,00	8.926,05	8.926,05	8.926,05	8.926,05	8.926,05	17.852,11	17.852,11	17.852,11	17.852,11	8.926,05	6.747,32				
8	CIRCULAÇÃO E TODA AREA DE ESPERA E LIMPEZA FINAL	R\$ 26.320,71	% Período:	41,46%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	8,54%								10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 10.912,31	1.316,04	1.316,04	2.632,07	2.632,07	2.248,05								2.632,07	2.632,07	2.632,07
Total:			%:	22,28%	2,38%	3,12%	4,56%	4,56%	8,46%	9,13%	9,44%	7,91%	7,28%	6,40%	5,10%	4,43%	2,47%	2,47%	2,47%
R\$ 1.000.021,34			Investimento:	222.827,31	23.756,93	31.224,17	45.627,70	45.627,70	84.644,45	91.322,46	94.381,89	79.104,31	72.815,62	63.953,98	51.004,84	44.257,52	24.736,23	24.736,23	24.736,23
			Acumulado:		2,38%	3,12%	4,56%	4,56%	8,46%	9,13%	9,44%	7,91%	7,28%	6,40%	5,10%	4,43%	2,47%	2,47%	2,47%
			Investimento:	222.827,31	246.584,24	277.808,41	323.436,11	369.063,81	453.708,27	545.030,73	639.412,62	718.516,93	791.332,55	855.286,53	906.291,37	950.548,89	975.285,11	1.000.021,34	1.000.021,34

